

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele:

u zhotovitele: **325 536**

1. Smluvní strany

Název: **Město Šluknov**
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČO: 00261688
DIČ: CZ00261688
Zástupce: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta
Číslo účtu: 108724561/0300
E-mail: kolonecny@mesto-sluknov.cz
Telefon: 412 315 300, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail: chroust@mesto-sluknov.cz
Telefon: 412 315 330
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
Zastoupený: Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 2572360297/0100, 345172/0800
Telefon: 412 704 520
E-mail tel. mob: samdecin@sam-dc.cz , 412 704 524
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:

E-mail, tel. Mobil: Jindřich Švec, vedoucí odštěpného závodu 02
svec@sam-dc.cz, mob: 731 437 958
a následně jmenovaný stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce nazvané „**Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2025**“, realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „zadávací řízení“*), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří:
 - a) oceněný soupis prací s výkazem výměr (*dále jen „položkový rozpočet“*),
 - b) Popis prací
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s popisem prací a dalšími součástmi zadávací dokumentace podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a připraven podle nich poskytnout objednateli sám či prostřednictvím poddodavatelů veškeré plnění sjednané v této smlouvě.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
2. Dílem je **Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2025**. Dílo je podrobně specifikováno v popisu prací a položkovém rozpočtu.
3. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také:
 - a) realizace přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 - b) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení,
 - c) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp. projektového stavu,
 - d) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou vč. všech jejích příloh a právními předpisy, jako plně funkční a provozuschopné, minimálně v estetické kvalitě, kterou lze považovat u srovnatelných děl za obvyklou.
5. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, platí jejich následující priorita: 1. smlouva o dílo (bez příloh), 2. zadávací dokumentace (bez příloh), 4. položkový rozpočet, 5. popis prací. Na jakémkoliv rozporu je zhotovitel v každém případě povinen objednatele bezodkladně upozornit a vyžádat si jeho pokyn, jak dále postupovat. V případě, že by tento pokyn znamenal odchylku od výše uvedeného pořadí či jinou změnu smlouvy, upraví smluvní strany tuto smlouvu písemným dodatkem.

4. Místo plnění

1. Místo plnění je specifikováno v zadávací dokumentaci.

5. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 15.04.2025

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tento harmonogram je zhotovitel povinen průběžně aktualizovat.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny:
 - a) předání dokončeného díla a vyklizeného staveniště objednateli – do 31.07.2025.
4. Termín předání díla se automaticky prodlužuje o počet dnů, kdy zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu:
 - a) překážek bránících provádění díla, které zhotovitel před uzavřením této smlouvy nemohl předvídat při vynaložení péče, kterou po něm bylo možné spravedlivě požadovat, a jejichž vzniku nemohl při vynaložení rozumného úsilí předejít,
 - b) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležitě kvalitě, za předpokladu, že zhotovitel v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky v době, kdy má být prováděno dílo, a skutečné klimatické podmínky se podstatně vymykaly podmínkám obvyklým v předchozích 5 letech,za podmínky, že přerušení provádění díla zhotovitel bezodkladně oznámil objednateli a informoval jej o důvodu a předpokládané délce přerušení.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek dodržení sjednaných termínů.

6. Cena díla

1. **Cena díla bez DPH:4.690.959,98 Kč.**
DPH 21 %:985.101,60 Kč.
Cena díla vč. DPH:5.676.061,58 Kč.

K ceně bez DPH je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

2. Výše uvedená cena díla se sjednává jako cena paušální, platná po celou dobu provádění díla, až do jeho dokončení a předání a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a poskytnutím veškerého dalšího sjednaného plnění objednateli. Změna nákladů v důsledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat změnu ceny díla.
3. Cena díla může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami díla.

7. Platební podmínky

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem.
2. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce na částku odpovídající ceně provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy přílohou příslušné faktury.
3. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit pověřenému zaměstnanci investora vždy do 5 dnů od uplynutí kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol bude obsahovat seznam veškerých skutečně provedených prací v tomto měsíci v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. Pověřený zaměstnanec investora neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení ze strany pověřeného zaměstnance

investora, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy považuje za předané) účtovat. V případě, že se pověřený zaměstnanec investora k návrhu zjišťovacího protokolu nevyjádří ani do 10 dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za odsouhlasený.

4. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.
5. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. případných požadavků poskytovatele dotace nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli přede dnem její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

8. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, a to i v případě, že plní pomocí poddodavatelů, které objednatel doporučil či předem schválil.
2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s využitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, k němuž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.
3. To, co se v předchozím odstavci uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení.
4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů vč. údaje o jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je povinen na vyžádání předložit objednateli.

9. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veškerých provedených zkouškách a revizích.
3. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby minimalizoval negativní účinky provádění stavby na její okolí.
4. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě vzniku škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a neprodleně odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství, příjezdových komunikací apod.
6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště kdykoliv v průběhu provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny předem i jiných jednání.

8. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.
9. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plochy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené na majetku objednatele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením v předchozí stav, nebude-li dohodnuto jinak.
10. O předání a vrácení staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachycen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená doba k jejich odstranění.

10. Použité materiály a výrobky

1. Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu výhradně výrobky, materiály a konstrukce, které mají vlastnosti požadované platnými právními předpisy a touto smlouvou. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat doložení příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů.
2. Veškeré zhotovitelem dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve používané či repasované.
3. V případech uvedených v projektové dokumentaci se zhotovitel zavazuje předem konzultovat barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. formou vzorků s objednatelem a poskytnout mu k vyjádření nejméně 5 pracovních dní. Zhotovitel není oprávněn použít řešení neodsouhlasená objednatelem. Odpovědnost za včasné objednání a dodání materiálů a výrobků nese zhotovitel.

11. Předání a převzetí díla

1. Má se za to, že dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
 - a) zhotovitel řádně provedl a dokončil v souladu s touto smlouvou veškeré stavby a stavební, montážní, terénní a jiné práce a dodávky dle smlouvy, bez vad a nedodělků podstatnějších než „drobné“, kterými se pro potřeby smlouvy rozumí takové ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle smlouvy, ani se nejedná o podstatné estetické nedostatky díla a současně:
 - b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čl. 3. odst. 3. této smlouvy,
 - c) zhotovitel vyklidil staveniště,
 - d) zhotovitel připravil a přehledně pro objednatele shromáždil kompletní dokumentaci k dílu, zejména pak:
 - záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - doklady o likvidaci odpadů,
2. Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání.
3. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany předávací protokol, do kterého zaznamenají zejména: identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis předané dokumentace k dílu, soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich odstranění a prohlášení o převzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem.
4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, odstraní je zhotovitel v dohodnutých termínech, jinak do 14 dnů od předání díla. Zhotovitel odstraní i ty vady a nedodělky, které mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada

či nedodělek byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na jejich odstranění.

5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně důvodů pro odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají náhradní termín předání díla. Zhotovitel odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnutém náhradním termínu, jinak do 30 dnů. (Tím není nijak dotčena povinnost zhotovitele předat dokončené dílo v termínu sjednaném v článku 5. této smlouvy.) Zhotovitel odstraní i ty nedostatky, které mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu nedostatek byl vytknut neoprávněně a nejednalo se o drobnou vadu či nedodělek, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na jeho odstranění.
6. Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se neodstaví k předání díla, odmítne podepsat předávací protokol, nebo prokáže-li zhotovitel, že objednatel odmítl dílo převzít neoprávněně, považuje se dílo za předané ke dni takového zmaření převzetí díla.

12. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí.
2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla plynoucí obvyklé) funkční a estetické vlastnosti (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému působení nepříznivých vlivů).
3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelům, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodělků uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsíců, s výjimkou
 - a) výrobků, na které zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce poskytované prodejcem, minimálně však 24 měsíců,
 - b) spotřebního materiálu.
4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projevily v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatelům uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu vznikl.
6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
7. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dohodnutém s objednatelům, jinak:
 - a) v případě běžné vady nejpozději do 14 dnů od oznámení vady objednatelům,
 - b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na majetku objednatelů nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin; totéž platí v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje užívání díla.Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny dodržet, provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky.
8. Zhotovitel je povinen za podmínek uvedených v tomto článku odstranit i ty vady, které mu, dle jeho názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-li zhotovitel bezodkladně po vytknutí vady, že za vadu neodpovídá. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada byla vytknuta neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na její odstranění.

9. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám či zajistit její odstranění třetí osobou, přičemž náklady vynaložené na odstranění vady nese zhotovitel a uhradí je objednateli do 30 dnů po předložení vyúčtování.

13. Smluvní sankce, odpovědnost za škodu

1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu:
 - a) ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla,
 - b) ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s
 - převzetím staveniště,
 - vyklizením staveniště,
 - odstraněním vady díla či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění,
2. Je-li zhotovitel v prodlení s plněním vícero na sebe navazujících termínů, smluvní pokuty se nesčítají – objednatel má nárok pouze na vyšší ze sjednaných pokut, na které by měl dle předchozího odstavce nárok.
3. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí přesáhnout částku odpovídající 1/3 ceny díla bez DPH.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom rozsahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně a oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo v případech sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy,
 - b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění díla, a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele,
 - c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
 - d) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana dosud nezjednála nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení stále trvá.
5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné.

6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelům dosud proplacených faktur. Zhotovitel je současně povinen v této lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou (dle položkového rozpočtu), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležitě kvalitě, bez vad a nedodělků, zhotovitel ve vztahu k nim předá objednateli veškerou potřebnou dokumentaci v rozsahu minimálně dle čl. 11. odst. 1. této smlouvy a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo není schopen naplnit v ní uvedené předpoklady, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle položkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materiály a movité věci, které se nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.
7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel. Obdobně je oprávněn provést dokumentaci stavu díla zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součinnost objednatel.
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

15. Změny smlouvy

1. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle násl. odstavce.
2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků v položkovém rozpočtu, projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel:
 - a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 3 a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu; teprve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto práce provede a bude mít právo na jejich úhradu; bez dodržení výše sjednaného postupu nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za práce nesjednané v této smlouvě; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření písemného dodatku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list, tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě druhé strany;
 - b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací nebo termín dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací ze strany objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 3 a předložit objednateli tento soupis k odsouhlasení formou změnového listu; součástí změnového listu může být též návrh zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn; takový návrh se

objednatel zavazuje přijmout; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření písemného dodatku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list, tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě druhé strany.

3. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS, nebo ve výši v místě a čase obvyklé, pokud se položka v této cenové soustavě nevyskytuje.
4. Ke změnovým listům se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jejich předložení, k návrhu rozsahu prací dle odst. 2 písm. b) vznesenému zhotovitelem se objednatel zavazuje vyjádřit bez zbytečného odkladu.
5. Zhotovitel se zavazuje na změny díla za podmínek sjednaných v odst. 2 přistoupit, pokud mu v tom nebudou bránit vážné důvody, a v případě žádosti objednatele o jiné změny díla předložit objednateli nabídku oceněnou dle odst. 3.
6. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. O změnách této smlouvy má za objednatele oprávnění rozhodovat rada města, a v případě změn dle odst. 2 oprávněný zaměstnanec investora.

16. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran bez zbytečného odkladu, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šluknov č. 9/65R/2025 ze dne 26.02.2025.

Přílohy:

1. *Položkový rozpočet – 2x*
2. *Popis prací*
3. *Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)*

Ve Šluknově dne

V Děčíně dne

.....
za objednatele
město Šluknov

Ing. Tomáš Kolonečný
starosta

.....
za zhotovitele
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Petr Podrazil
výkonný ředitel

Lokalita č. 1 - Resslerova

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j	M.j.	Odbyt jedn. orig	Odbyt celk.
001	9,2E+08	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	20,000	M2	150,00	3000,00
002	9,97E+08	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	5,280	T	250,00	1320,00
003	9,97E+08	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	131,6	T	16,00 Kč	2 105,60 Kč
004	1,71E+08	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	5,3	T	300,00 Kč	1 599,00 Kč
005	1,13E+08	Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl do 10 0000 m2 bez překážek v trase	844,0	m2	24,00 Kč	20 256,00 Kč
006	9,97E+08	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	112,4	T	150,00 Kč	16 866,00 Kč
007	1,82E+08	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	844,0	m2	10,00 Kč	8 440,00 Kč
008	8,99E+08	Výšková úprava vodovodního poklůpku do 200 mm	6,0	KUS	1 450,00 Kč	8 700,00 Kč
009	8,99E+08	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	2,0	KUS	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
010	5,72E+08	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	55,270	T	1200,00	66 324,00 Kč
011	5,73E+08	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	844,000	M2	18,00	15192,00
012	5,77E+08	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	844,000	M2	345,00	291180,00
013	5,99E+08	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	20,000	M	150,00	3000,00
014	569911130	Stržení nánosů z krajnic a vjezdů a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	211,0	M2	55,00 Kč	11 605,00 Kč
015	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
016	#####	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2000,00	2000,00
Celkem bez DPH			456 087,60 Kč			
DPH 21%			95 778,40 Kč			
Celkem včetně DPH			551 866,00 Kč			

Lokalita č. 2 - Království Barcal

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
001	9,2E+08	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	28,000	M2	350,00	9800,00
002	9,97E+08	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	7,392	T	250,00	1848,00
003	9,97E+08	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	183,8	T	16,00 Kč	2 940,00 Kč
004	1,71E+08	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	7,4	T	300,00 Kč	2 205,00 Kč
005	1,82E+08	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	920,0	M2	20,00 Kč	18 400,00 Kč
006	5,65E+08	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	920,000	m2	265,00	243 800,00 Kč
007	5,73E+08	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	920,000	M2	18,00	16 560,00 Kč
008	5,77E+08	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	920,000	M2	280,00	257 600,00 Kč
009	5,99E+08	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	28,000	M	150,00	4 200,00 Kč
010	569911130	Stržení nánosů z krajnic a vjezdů a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	215,0	M2	55,00 Kč	11 825,00 Kč
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
012	#####	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2000,00	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH			573 178,00 Kč			
DPH 21%			120 367,38 Kč			
Celkem včetně DPH			693 545,38 Kč			

Lokalita č. 3 - Nové Hraběcí Liščák

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
001	9,2E+08	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	19,000	M2	350,00	6650,00
002	9,97E+08	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	12,540	T	250,00	3135,00
003	9,97E+08	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	311,6	T	16,00 Kč	4 985,60 Kč
004	1,71E+08	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	12,6	T	300,00 Kč	3 777,00 Kč
005	1,82E+08	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	669,0	M2	20,00 Kč	13 380,00 Kč
006	5,65E+08	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	669,000	m2	265,00	177 285,00 Kč
007	5,73E+08	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	669,000	M2	18,00	12 042,00 Kč
008	5,77E+08	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	669,000	M2	280,00	187 320,00 Kč
009	5,99E+08	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	19,000	M	150,00	2 850,00 Kč
010	569911130	Stržení nánosů z krajnic a vjezdů a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	181,0	M2	55,00 Kč	9 955,00 Kč
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,0	roubo	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
012	#####	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2000,00	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH			425 379,60 Kč			
DPH 21%			89 329,72 Kč			
Celkem včetně DPH			514 709,32 Kč			

Lokalita č. 4 - Královka

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
1	9,2E+08	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	19,000	M2	350,00	6650,00
2	9,97E+08	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	12,540	T	250,00	3135,00
3	9,97E+08	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	311,6	T	16,00 Kč	4 985,60 Kč
4	1,71E+08	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	12,6	T	300,00 Kč	3 777,00 Kč
005	1,82E+08	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	1595,0	M2	10,00 Kč	15 950,00 Kč
006	5,72E+08	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	104,4	T	1 000,00 Kč	104 440,00 Kč
007	5,73E+08	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	1595,0	M2	18,00 Kč	28 710,00 Kč
008	5,77E+08	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1595,0	M2	345,00 Kč	550 275,00 Kč
009	5,99E+08	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	19,0	M	150,00 Kč	2 850,00 Kč
010	569911130	Stržení nánosů z krajnic a vjezdů a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	464,0	M2	55,00 Kč	25 520,00 Kč
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
012	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH			750 292,60 Kč			
DPH 21%			157 561,45 Kč			
Celkem včetně DPH			907 854,05 Kč			

Lokalita č. 5 - Na Příkopě

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	30,000	M2	350,00	10500,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	7,920	T	250,00	1980,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	197,4	T	16,00 Kč	3 158,40 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	8,0	T	300,00 Kč	2 400,00 Kč
005	113154333	Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl do 10 0000 m2 bez překážek v trase	1437,0	m2	30,00 Kč	43 110,00 Kč
006	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	191,4	T	150,00 Kč	28 714,50 Kč
007	181951102	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	1437,0	m2	10,00 Kč	14 370,00 Kč
008	899331111r	Zřízení nové uliční vpusti včetně napojení (vybourání stávající, kompletní vpust', koš, mříž, 1m napojen	6,0	KUS	13 500,00 Kč	81 000,00 Kč
009	899338888	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	12,0	KUS	1 250,00 Kč	15 000,00 Kč
010	899338888	Výšková úprava uliční vpusti do 200mm	21,0	KUS	2 470,00 Kč	51 870,00 Kč
011	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	94,104	T	1100,00	103 514,40 Kč
012	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	1437,000	M2	18,00	25 866,00 Kč
013	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	1437,000	M2	345,00	495 765,00 Kč
014	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	30,000	M	150,00	4 500,00 Kč
015	569911130R	Stržení nánosů z krajnic a vjezdů a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	200,000	m2	55,00	11 000,00 Kč
016	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
017	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2000,00	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH			896 748,30 Kč			
DPH 21%			188 317,14 Kč			
Celkem včetně DPH			1 085 065,44 Kč			

Lokalita č. 6 - Spodní cesta Království

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
001	9,2E+08	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	7,500	M2	350,00	2625,00
002	9,97E+08	Odvoz asphaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	1,980	T	250,00	495,00
003	9,97E+08	Příplatek k odvozu asphaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	49,4	T	16,00 Kč	789,60 Kč
004	1,71E+08	Poplatek za uložení asphaltobetonu na skládce (skládkovné)	2,0	T	300,00 Kč	600,00 Kč
005	1,13E+08	Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl do 10 0000 m2 bez překážek v trase	645,0	m2	30,00 Kč	19 350,00 Kč
006	9,97E+08	Odvoz asphaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	85,9	T	150,00 Kč	12 889,50 Kč
007	1,82E+08	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	645,0	m2	10,00 Kč	6 450,00 Kč
008	5,72E+08	Vyrovnání povrchu asphaltobetonovou směsí ACO 11S	42,240	T	1200,00	50 688,00 Kč
009	5,73E+08	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	645,000	M2	18,00	11 610,00 Kč
010	5,77E+08	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	645,000	M2	350,00	225 750,00 Kč
011	5,99E+08	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	7,500	M	150,00	1 125,00 Kč
012	569911130	Stržení nánosů z krajnic a vjezdů a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	215,0	M2	55,00 Kč	11 825,00 Kč
013	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
014	#####	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2000,00	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH			348 197,10 Kč			
DPH 21%			73 121,39 Kč			
Celkem včetně DPH			421 318,49 Kč			

Lokalita č. 7 - Luční

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	10,000	M2	350,00	3500,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	2,640	T	250,00	660,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	65,8	T	16,00 Kč	1 052,80 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	2,7	T	300,00 Kč	798,00 Kč
005	181951102	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	479,0	m2	10,00 Kč	4 790,00 Kč
006	899334444	Výšková úprava vodovodního poklůpku do 200 mm	4,0	KUS	1 450,00 Kč	5 800,00 Kč
007	899338888	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	2,0	KUS	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
008	899331111r	Zřízení nové uliční vpusti včetně napojení (vybourání stávající, kompletní vpust', koš, mříž, 1m napojen	7,0	KUS	13 500,00 Kč	94 500,00 Kč
009	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	31,366	T	1200,00	37 639,20 Kč
010	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	479,000	M2	18,00	8622,00
011	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	479,000	M2	350,00	167650,00
012	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	10,000	M	150,00	1500,00
013	569911130R	Stržení nánosů z krajnic a vjezdů a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	124,0	M2	55,00 Kč	6 820,00 Kč
014	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
015	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2000,00	2000,00
Celkem bez DPH			339 832,00 Kč			
DPH 21%			71 364,72 Kč			
Celkem včetně DPH			411 196,72 Kč			

Lokalita č. 8 - VP Budišinská

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j	M.j.	Odbyt jedn. orig	Odbyt celk.
001	9,2E+08	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	15,000	M2	350,00	5250,00
002	9,97E+08	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	3,960	T	250,00	990,00
003	9,97E+08	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	98,7	T	16,00 Kč	1 579,20 Kč
004	1,71E+08	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	4,0	T	300,00 Kč	1 188,00 Kč
005	8,99E+08	Výšková úprava vodovodního poklůpku do 200 mm	2,0	KUS	1 450,00 Kč	2 900,00 Kč
006	8,99E+08	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	2,0	KUS	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
007	8,99E+08	Výšková úprava uliční vpusti do 200mm	2,0	KUS	2 470,00 Kč	4 940,00 Kč
008	5,65E+08	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	360,000	M2	310,00	111 600,00 Kč
009	5,73E+08	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	360,000	M2	18,00	6480,00
010	5,77E+08	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	360,000	M2	295,00	106200,00
011	5,99E+08	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	15,000	M	150,00	2250,00
012	569911130	Stržení nánosů z krajnic a vjezdů a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	35,0	M2	55,00 Kč	1 925,00 Kč
013	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
014	#####	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2000,00	2000,00
Celkem bez DPH			251 802,20 Kč			
DPH 21%			52 878,46 Kč			
Celkem včetně DPH			304 680,66 Kč			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023066-R2
Stavba: Opěrná zeď u rekreačního objektu č.ev.117, k.ú. Královka, Šluknov

KSO:
Místo: p.p.č.k. 19/3,19/6,687, k.ú.Královka

CC-CZ:
Datum: 04.02.2025

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Hon

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			649 442,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	649 442,58	136 382,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			785 825,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023066-R2

Stavba:

Opěrná zeď u rekreačního objektu č.ev.117, k.ú. Královka, Šluknov

Místo:

p.p.č.k. 19/3,19/6,687, k.ú.Královka

Zadavatel:

Město Šluknov

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum:

04.02.2025

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Hon

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		649 442,58	785 825,52	
SO 0	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00	24 200,00	STA
SO 01	Opěrná zeď	629 442,58	761 625,52	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opěrná zeď u rekreačního objektu č.ev.117, k.ú. Královka, Šluknov

Objekt:
SO 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: p.p.č.k. 19/3,19/6,687, k.ú.Královka

CC-CZ:
Datum: 04.02.2025

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude vybrán

IČ:
DIČ:

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Hon

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 000,00	21,00%	4 200,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opěrná zeď u rekreačního objektu č.ev.117, k.ú. Královka, Šluknov

Objekt: **SO 0 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:	p.p.č.k. 19/3,19/6,687, k.ú.Královka	Datum:	04.02.2025
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Zhotovitel:	bude vybrán	Zpracovatel:	Jakub Hon

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opěrná zeď u rekreačního objektu č.ev.117, k.ú. Královka, Šluknov

Objekt: SO 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.p.č.k. 19/3,19/6,687, k.ú.KrálovkaDatum: 04.02.2025

Zadavatel: Město ŠluknovProjektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: bude vybránZpracovatel: Jakub Hon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem20 000,00

DVRNVedlejší rozpočtové náklady20 000,00

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce10 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PPGeodetické práce před výstavbou

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

DVRN3Zařízení staveniště5 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PPZařízení staveniště včetně zabezpečení stavby

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

DVRN7Provozní vlivy5 000,00

6	K	070001000	Provozní vlivy včetně DIO, DIR, dopravního značení a poplatků	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PPProvozní vlivy včetně DIO, DIR, dopravního značení a poplatků

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opěrná zeď u rekreačního objektu č.ev.117, k.ú. Královka, Šluknov

Objekt:
SO 01 - Opěrná zeď

KSO:
Místo: p.p.č.k. 19/3,19/6,687, k.ú.Královka

CC-CZ:
Datum: 04.02.2025

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude vybrán

IČ:
DIČ:

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Hon

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			629 442,58
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	629 442,58	21,00%	132 182,94
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	761 625,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opěrná zeď u rekreačního objektu č.ev.117, k.ú. Královka, Šluknov

Objekt: **SO 01 - Opěrná zeď**

Místo:	p.p.č.k. 19/3,19/6,687, k.ú.Královka	Datum:	04.02.2025
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Zhotovitel:	bude vybrán	Zpracovatel:	Jakub Hon

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		629 442,58
HSV - Práce a dodávky HSV		605 522,10
1 - Zemní práce		192 010,75
2 - Zakládání		86 830,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce		165 265,00
5 - Komunikace pozemní		26 400,00
8 - Trubní vedení		8 832,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		36 291,40
997 - Přesun sutě		50 242,00
998 - Přesun hmot		39 650,85
PSV - Práce a dodávky PSV		23 920,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		23 920,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opěrná zeď u rekreačního objektu č.ev.117, k.ú. Královka, Šluknov

Objekt: SO 01 - Opěrná zeď

Místo: p.p.č.k. 19/3,19/6,687, k.ú.Královka

Datum: 04.02.2025

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: bude vybrán

Zpracovatel: Jakub Hon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

629 442,58

D HSV Práce a dodávky HSV605 522,10

D 1 Zemní práce192 010,75

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
VV			2*2 "demontáž stávající dlažby ke zpětné montáži		4,000			
2	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	31,250	150,00	4 687,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107325					
VV			12,5*2,5		31,250			
3	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	31,250	130,00	4 062,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343					
VV			12,5*2,5		31,250			
4	K	122151503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	79,600	190,00	15 124,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151503					
VV			4,22*12,5 "vysvahování v komunikaci		52,750			
VV			14,08*1 "Pohled C-C - venkovní část		14,080			
VV			7,27*1 "Pohled B-B - venkovní část		7,270			
VV			22*0,5*0,5 "vnitřní část		5,500			
VV			Součet		79,600			
5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	169,825	40,00	6 793,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
VV			4,22*12,5 "Odtěžení v komunikace -Pohled A-A		52,750			
VV			14,08*1 "Pohled C-C		14,080			
VV			7,27*1 "Pohled B-B		7,270			
VV			22*0,5*0,5 "vnitřní část		5,500			
VV			90,225 "štěrk a recyklát na zásyp		90,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		169,825			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,600	230,00	18 308,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		4,22*12,5 "Odtěžení v komunikace -Pohled A-A		52,750			
	VV		14,08*1 "stávající stěna - Pohled C-C		14,080			
	VV		7,27*1 "stávající stěna - Pohled B-B		7,270			
	VV		22*0,5*0,5 "vnitřní část		5,500			
	VV		Součet		79,600			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	169,825	100,00	16 982,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
	VV		4,22*12,5 "Odtěžení v komunikace -Pohled A-A		52,750			
	VV		14,08*1 "Pohled C-C		14,080			
	VV		7,27*1 "Pohled B-B		7,270			
	VV		22*0,5*0,5 "vnitřní část		5,500			
	VV		90,225 "šterk a recyklát na zásyp		90,225			
	VV		Součet		169,825			
9	K	R	Laboratorní rozborů stavebního odpadu zeminy a kamení pro použití k terénním úpravám	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		79,6		79,600			
	VV		79,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		159,200			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,225	150,00	13 533,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		2,10*12,5 "pohled A-A - betonový recyklát		26,250			
	VV		2,97*12,5 "pohled A-A - šterk 16/32		37,125			
	VV		14,08*1"stávající stěna - Pohled C-C - šterk 16/32		14,080			
	VV		7,27*1 "stávající stěna - Pohled B-B - šterk 16/32		7,270			
	VV		22*0,5*0,5 "vnitřní část - šterk 16/32		5,500			
	VV		Součet		90,225			
11	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	127,950	610,00	78 049,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		63,975		63,975			
	VV		63,975*2 'Přepočtené koeficientem množství		127,950			
12	M	58981124	recyklát betonový frakce 16/32	t	52,500	400,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		recyklát betonový frakce 16/32					
	VV		26,25		26,250			
	VV		26,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		52,500			
13	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	23,000	70,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		23*1		23,000			
	D	2	Zakládání				86 830,10	
14	K	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	23,000	120,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212792211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		23		23,000			
15	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	23,000	30,00	690,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212972112					
16	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,732	1 500,00	4 098,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		(13,27+3+6,5)*1,2*0,1 "pod základové pasy		2,732			
17	K	274322511-R1	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	13,662	4 550,00	62 162,10	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25-XC2					
	VV		(13,27+3+6,5)*1,2*0,5 " základové pasy		13,662			
18	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	24,000	225,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		48*0,5		24,000			
19	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	24,000	30,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
	VV		48*0,5		24,000			
20	K	274361321	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 11 375 (EZ)	t	0,275	40 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 11 375 (EZ)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361321					
	VV		(25,1*8)*0,395/1000 "Vodorovná R8		0,079			
	VV		(2,2*100)*0,89/1000 "Třmínky R12		0,196			
	VV		Součet		0,275			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				165 265,00	
21	K	311113146	Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	45,125	2 500,00	112 812,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113146					
	VV		(10,5*2,25)+(2*1,75)+(1*2) "Pohled A-A		29,125			
	VV		(5*1,75)+(0,5*1,5)+(0,5*1,25)+(0,5*1) "Pohled C-C		10,625			
	VV		(1*2,25)+(0,5*2)+(0,5*1,75)+(0,5*1,5)+(0,5*1) " Pohled B-B		5,375			
	VV		Součet		45,125			
22	K	311361321	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 11 375	t	0,431	40 000,00	17 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 11 375 (EZ)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361321					
	VV		((12,5*6*2)+(11,5*2)+(10,5*2)+(7*3*2)+(6,5*2)+(6*2)+(5,5*2)+(3,5*3*2)+(3*2*2)+(2,5*2)+(2*2)+(1,5*2))*0,395/1000		0,125			
	VV		"Vodorovná R8					
	VV		((1,75*50)+(0,25*46)+(0,25*42)+(1,5*28)+(0,25*26)+(0,25*24)+(0,25*22)+(1,5*14)+(0,5*12)+(0,25*10)+(0,25*8)+(0,25*6))*0,89/1000 "Svislá R12		0,180			
	VV		((1,75*50)+(0,25*46)+(0,25*42)+(1,5*28)+(0,25*26)+(0,25*24)+(0,25*22)+(1,5*14)+(0,5*12)+(0,25*10)+(0,25*8)+(0,25*6))*0,62/1000 "Svislá R10		0,126			
	VV		Součet		0,431			
23	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	5,000	440,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171113					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	5,000	190,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
PP			sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm					
25	K	3480000-R1		m	23,000	1 250,00	28 750,00	
PP			D+M plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých, sedlového tvaru přírodní barvy, tloušťka zdiva 500mm					
26	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	12,500	160,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401120					
VV			12,5					
27	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	13,125	100,00	1 312,50	CS ÚRS 2023 02
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm					
VV			12,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
D 5			Komunikace pozemní					
28	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	31,250	400,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111					
VV			12,5*2,5					
31	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,250	400,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145112					
VV			12,5*2,5					
32	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111					
VV			2*2 "zpětná montáž zámkové dlažby					
D 8			Trubní vedení					
34	K	871212201	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE PE 100 SDR 17 PN10 50x3	m	16,100	120,00	1 932,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 50x3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871212201					
VV			23*0,7 "potrubí do opěrné stěny pro odvod vody po 1m (délka potrubí 0,7m) 23ks					
35	K	8710000-R1	Příplatek za zhotovení otvoru v opěrné stěně	kus	23,000	300,00	6 900,00	
PP			Příplatek za zhotovení otvoru v opěrné stěně					
VV			23 "otvory v opěrné stěně					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
VV			2,5+2,5 "stávající cesta					
37	K	962022591	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m3	m3	54,220	620,00	33 616,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022591					
VV			32,87*1 "stávající stěna - pohled A-A					
VV			14,08*1 "stávající stěna - Pohled C-C					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,27*1 "stávající stěna - Pohled B-B		7,270			
	VV		Součet		54,220			
38	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071721					
39	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	12,500	110,00	1 375,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071821					
	VV		12,5		12,500			
D	997		Přesun sutě				50 242,00	
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	156,412	150,00	23 461,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
41	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	454,250	18,00	8 176,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i					
			započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
	VV		9,875 asphalt		156,412			
	VV		9,875*46 'Přepočtené koeficientem množství		7 194,952			
42	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	156,412	100,00	15 641,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
44	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,875	300,00	2 962,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	VV		9,875 "stávající komunikace		9,875			
D	998		Přesun hmot				39 650,85	
45	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	98,100	200,00	19 620,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998152111					
46	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	57,231	350,00	20 030,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998153211					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 920,48	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				23 920,48	
47	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	64,400	70,00	4 508,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273					
	VV		33,7+5 "Pohled A-A		38,700			
	VV		15+2,8 "Pohled C-C		17,800			
	VV		6,5+1,4 "Pohled B-B		7,900			
	VV		Součet		64,400			
48	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	78,632	50,00	3 931,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		64,4*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		78,632			
49	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	35,500	140,00	4 970,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383					
	VV		17+8+10,5		35,500			
50	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	69,000	110,00	7 590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272					
	VV		23*3		69,000			
51	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	72,450	40,00	2 898,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,450			
52	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,026	880,00	22,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					


Popis prací akce „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2025“

Předmětem prací je oprava místních komunikací z poškozeného asfaltobetonu, případně stávajících štěrkových komunikací určených k vyasfaltování. Jedná se celkem o 8 lokalit, přičemž práce lze rozdělit v zásadě do tří kategorií. Rozsah úprav je vyznačen v příložených mapových podkladech a před realizací bude přesně vyznačen zadavatelem. Samostatnou součástí stavby (která musí předcházet opravě komunikace v lokalitě č. 4) je oprava opěrné zdi v místní části Královka.


Lokality č. 1, 5, 6 – komunikace se stávajícím degradovaným povrchem, který bude odfrézován. Odfrézovaný povrch tak bude očištěn a srovnán asfaltobetonovou směsí ACO 11s v potřebné tloušťce, průměrně 2-3 cm. Požadovaná tonáž je uvedena v dílčích výkazech výměr. Na tuto vyrovnanou vrstvu bude po provedení postřiku položena obrusná vrstva tl. 5 cm. Součástí prací je napojení zápichu s odvozem vybouraných asfaltových ker a likvidací na skládce, odvoz a složení vyfrézované živice na deponii zadavatele ve vzdálenosti do 1 km místa realizace, výšková úprava zařízení vodohospodářské infrastruktury, zálivka spár o šíři 0,5 m na každou stranu, DIO a úprava krajnic.

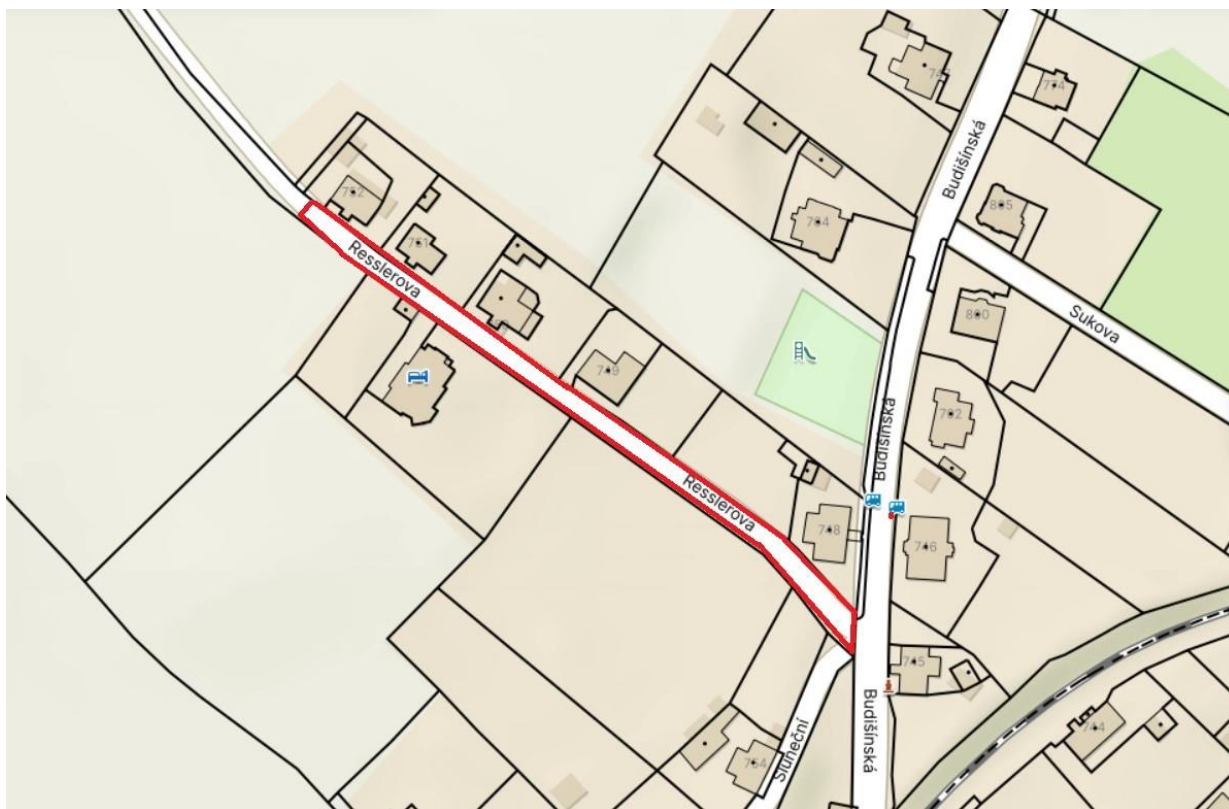

Ul. Resslerova

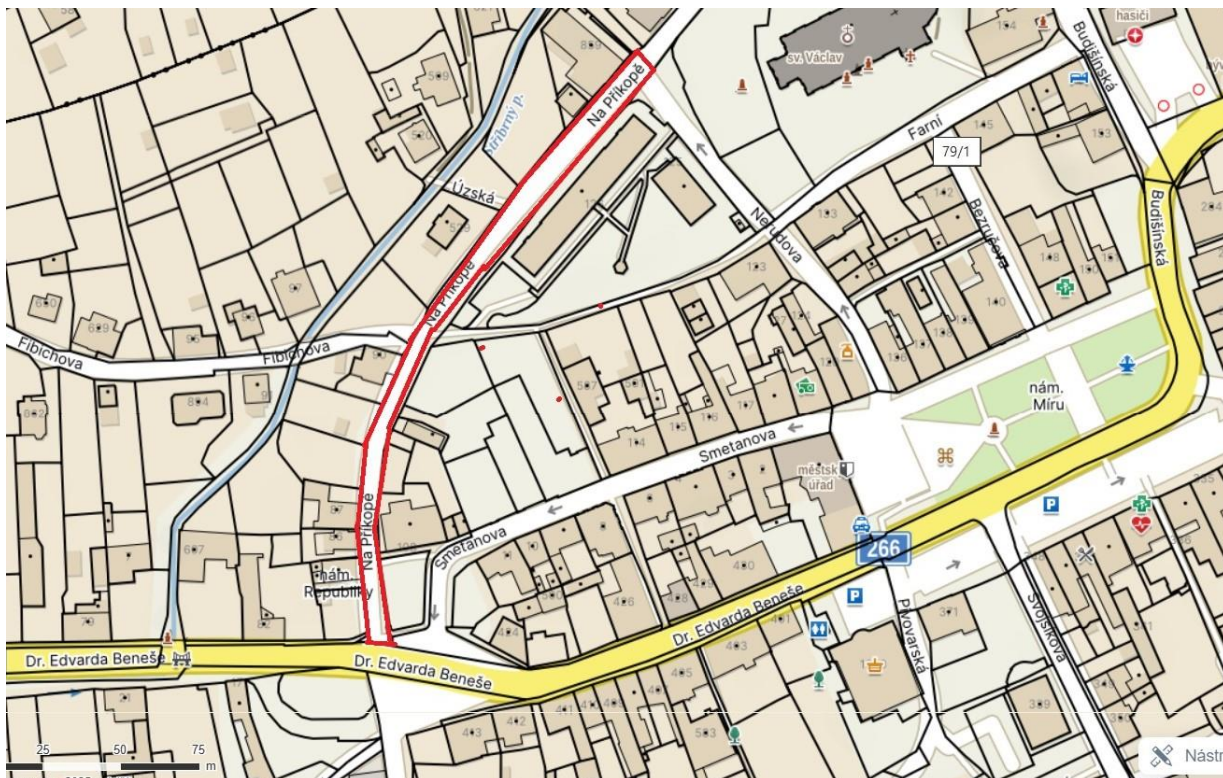


Ul. Na Příkopě

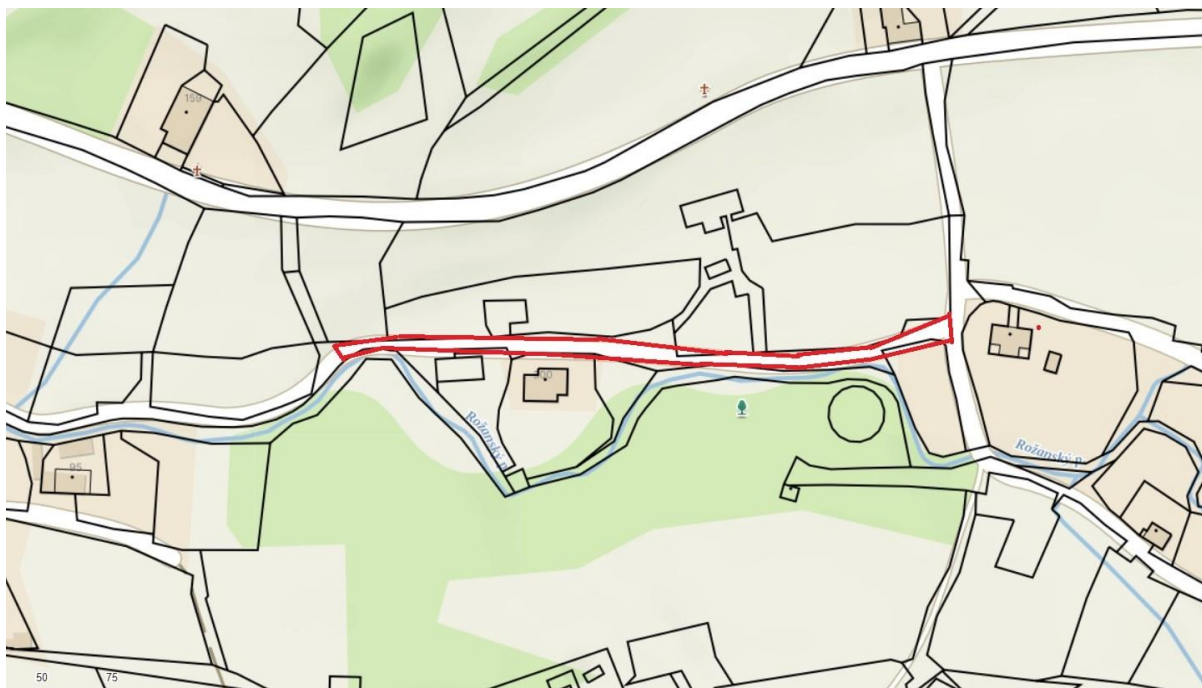

Spodní cesta Království

Lokality č. 2, 3, 8 – komunikace se šterkovým povrchem (který bude ze strany zadavatele prostřednictvím jiného zhotovitele před zahájením prací stržen a urovnán), které budou vyasfaltovány. Stávající povrch bude zhutněn a na něj položena nejprve vrstva podkladní tl. 5 cm a následně vrstva obrusná tl. 5 cm. Součástí prací je napojení zápichu, zřízení krajnic o šíři 0,5 m na každou stranu a DIO.

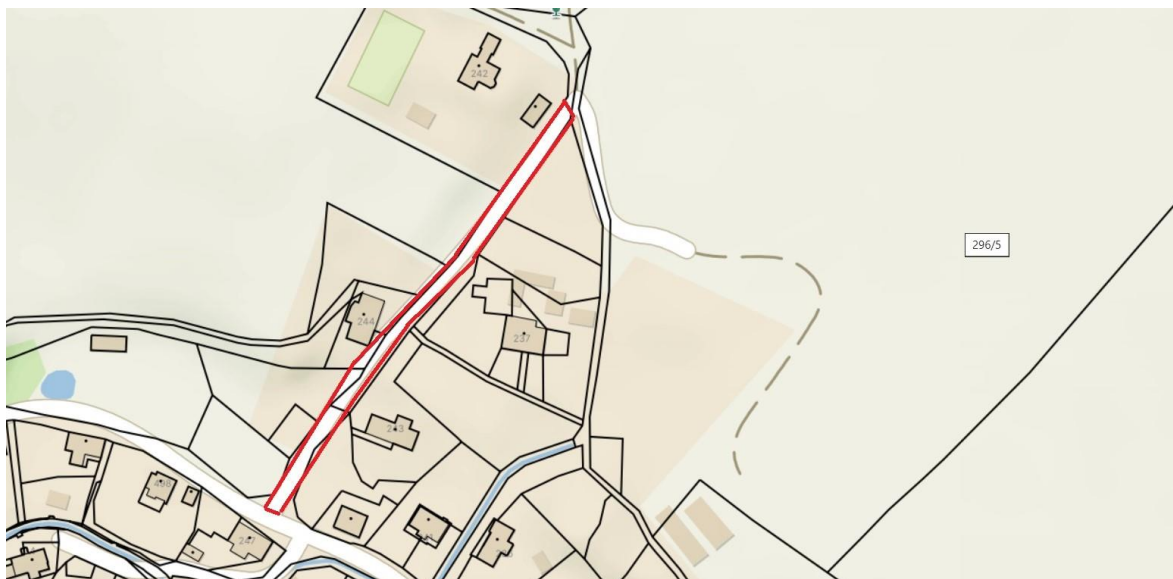

Království Barcal



Nové Hrabčcí Liščák




VP Budišinská

Lokality č. 4, 7– komunikace se stávajícím degradovaným asfaltovaným povrchem s příměsí větší frakce, který nebude odfrézován. Zdegradovaný povrch tak bude očištěn a srovnán asfaltobetonovou směsí ACO 11s v potřebné tloušťce, průměrně 2-3 cm. Požadovaná tonáž je uvedena v dílčích výkazech výměr. Na tuto vyrovnanou vrstvu bude po provedení postřiku položena ohrusná vrstva tl. 5 cm. Součástí prací je napojení zápichu s odvozem vybouraných asfaltových ker a likvidací na skládce, odvoz a složení vyfrézované živice na deponii zadavatele ve vzdálenosti do 1 km místa realizace, výšková úprava zařízení vodohospodářské infrastruktury, zálivka spár o šíři 0,5 m na každou stranu, DIO a úprava krajnic.



Královka

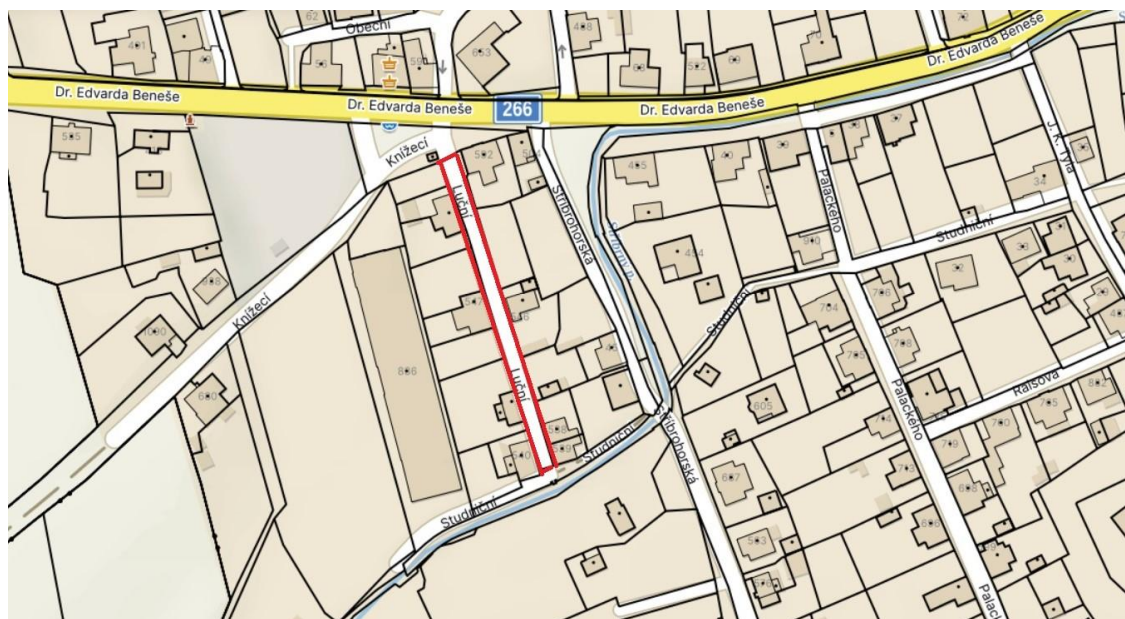

Ul. Luční

POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazil,

nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340

výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Ing.Dušan Drahoš
předseda představenstva



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva



Ing.Josef Horáček
člen představenstva



Pověření přijímám :

Petr Podrazil

